ボーリング柱状図

調　査　名　地方港湾　土生港　港湾海岸保全事業に伴う業務委託(三庄地区)

事業・工事名

ボーリングNo.	5	1	3	3	3	1	5	5	0	0	0

シートNo.

ボーリング名	Bor.No.5	調査位置	尾道市因島三庄町	北緯	34° 17′ 50.6587″
発注機関	広島県東部建設事務所三原支所	調査期間	平成28年11月21日～平成28年11月22日	東経	133° 11′ 50.7356″
調査業者名		主任技師		現場代理人	
コア鑑定者		ボーリング責任者			
孔口標高	CDL 4.52m	角度	180° 上 下 90° 0° 0°	方向	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南
地盤勾配	0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	YBM製YSO-1	
ハンマー落下用具	半自動型		エンジン	㈱ヤンマー製TF120VE型	
ポンプ	YBM製SP-40				
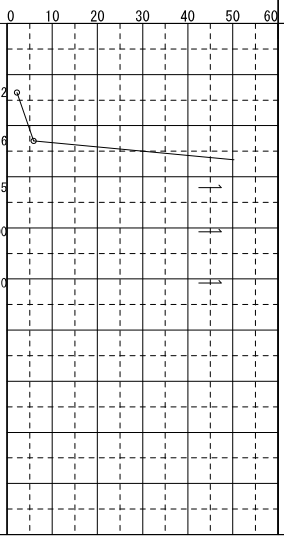
標尺 m	標高 m	層厚 m	深度 m	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記事	粒度試験による土質区分	孔内水位／測定月日	標準貫入試験 深度 m	10cm毎の打撃回数 0～10	10～20	20～30	打撃回数／貫入量	N値	原位置試験 深度 m	試験名及び結果	試料採取 深度 m	試料番号	採取方法	室内試験	掘進月日
	3.92	0.60	0.60		コンクリート	灰			表面はアスファルト。GL-0.5m付近砕石混入。															
1					礫混じり砂	褐	緩い		中～粗砂主体。φ5～20mmの礫を含む。φ80mm程度の玉石点在する。		11/21 1.35	1.15	1	1/15	1/15	3/40	2			1.15	P5-1	⊖	比重含水粒度	
2	1.97	1.95	2.55								11/22 2.45	1.55 2.15	2	2	2	6/30	6			1.55				
3	1.57	0.40	2.95		シルト混じり砂礫	暗褐灰			φ20～50mmの亜角礫。砂は不均質で細～粗砂。ビニール片混入。			2.45 3.15	33	17/3		50/13	115							11/21
4					花崗岩	淡褐灰	非常に密な		粗粒花崗岩。風化著しくマサ状を呈す。軟岩Ⅰ。DH級。			3.28 4.05	50/5			50/5	300							
5	-0.48	2.05	5.00									4.10 5.05	50/6			50/6	250							11/22
6												5.11												
7																								
8																								
9																								
10
